

LOTTE GRS

보수ON 사용 매뉴얼

보수공사 접수·트래킹 · 조명/타일 발주



휴대폰 카메라로 찍으면 바로 접속됩니다

<https://grs-interior.github.io/bosuon/>

역할별 사용법 · 업무 순서대로 정리

2026년 8월 기준 · 표준 품목표 2026.08.20 반영


장비 M/T 접수는 카카오톡 채널 → http://pf.kakao.com/_JExbnj

목차


1. 시작하기 모든 사용자 — 접속·로그인·알림 설정
2. 점포 보수 접수 · 오픈 직후 추가요청 · 일정 승인 · 완료 서명
3. 보수 시공업체 실측 · 견적 · 일정 · 공사 · 완료
4. 본사담당 — 보수공사 견적 검토 · 현황 관리 · 설정
5. 조명·타일 공급사 도면 확인 · 견적 제출 · 정산·청구
6. 인테리어 시공사 견적 확정 · 납품일 협의 · 납품확인서
7. 본사담당 — 조명·타일 발주 발주 등록 · 확정 · 정산
8. 함께 쓰는 기능 채팅 · 개선요청 게시판 · 알림
9. 문제가 생기면 자주 있는 상황과 해결 방법

업무 흐름 한눈에

보수공사



조명·타일 발주



직영점과 가맹점의 차이는 두 가지뿐입니다.

- ① 견적을 확정하는 사람 — 직영점은 GRS 공사담당자, 가맹점은 시공사 현장소장
 - ② 정산 방식 — 직영점은 본사에 월단위 청구, 가맹점은 시공사별 개별 청구
- 나머지 절차는 완전히 같습니다.



시작하기

모든 사용자 공통

주소로 접속해 소속을 고르고 접속코드를 입력하면 바로 사용할 수 있습니다. 설치나 회원가입은 필요 없습니다.

GRS 보수ON

보수공사 접수·트래킹 · 조명/타일 발주

소속 선택

점포

보수 시공업체

본사담당

인테리어 시공사

조명·타일 공급사

접속코드

소속별 접속코드 입력

입장하기

접속코드는 본사 보수담당자에게 문의하세요.

사용 매뉴얼 내려받기 (PDF)

장비 M/T 접수 관련 아래 링크 참고
http://pf.kakao.com/_JExbnj

GRS 보수ON

보수공사 접수·트래킹 · 조명/타일 발주

소속 선택

점포

보수 시공업체

본사담당

인테리어 시공사

조명·타일 공급사

점포명

점포명 검색 또는 입력

접속코드

소속별 접속코드 입력

입장하기

접속코드는 본사 보수담당자에게 문의하세요.

사용 매뉴얼 내려받기 (PDF)

장비 M/T 접수 관련 아래 링크 참고
http://pf.kakao.com/_JExbnj

GRS 보수ON

보수공사 접수·트래킹 · 조명/타일 발주

소속 선택

점포

보수 시공업체

본사담당

인테리어 시공사

조명·타일 공급사

시공사 선택

인테리어

업체별 전용 접속코드를 받으셨다면 그 코드를 입력하세요.

이름 (담당자)

예) 홍길동

접속코드

소속별 접속코드 입력

입장하기

접속코드는 본사 보수담당자에게 문의하세요.

사용 매뉴얼 내려받기 (PDF)

장비 M/T 접수 관련 아래 링크 참고
http://pf.kakao.com/_JExbnj

① 접속하면 나오는 첫 화면

② 점포는 점포명을 입력

③ 시공사는 업체를 선택

1 주소로 접속

표지의 QR을 찍거나 주소를 입력해 접속합니다.

2 소속 선택

점포 / 보수 시공업체 / 본사담당 / 인테리어 시공사 / 조명·타일 공급사 중 본인 소속을 고릅니다.

3 접속코드 입력

본사에서 받은 코드를 입력합니다. 인테리어 시공사는 **업체별 전용 코드**를 받으셨다면 그 코드를 씁니다.

4 홈 화면에 추가 (권장)

휴대폰 브라우저 메뉴에서 「홈 화면에 추가」를 누르면 앱처럼 쓸 수 있습니다. 아이폰은 이 과정을 거쳐야 알림이 동작합니다.

5 알림 켜기

첫 화면 상단의 「켜기」 또는 오른쪽 위 🔔 → 알림 설정에서 켵니다.

장비 M/T 접수는 별도입니다

조리기기·설비 등 장비 유지보수 접수는 카카오톡 채널로 진행합니다 — http://pf.kakao.com/_JExbnj (로그인 화면 하단에도 링크가 있습니다)



점포

점포관리자

보수공사를 접수하고 진행상황을 확인합니다. 오픈 직후 공사 보완·변경 요청도 같은 화면에서 넣습니다.

GRS 보수ON

점포

대시보드

접수 목록

채팅 2

+ 신규 접수

개선

점포 모드 — 보수공사 접수 및 진행상황 열람

보수공사

고장·누수·파손 등 일반 보수

오픈 직후 추가요청

오픈 후 공사 보완·변경 요청

점포명 (입력하면 전국 점포 목록에서 검색됩니다)

롯데리아 강남역점

공사 제목

예) 주방 배수구 막힘 및 누수

공사 내용 (상세)

증상, 위치, 영업 지장 여부 등을 적어주세요

긴급도

보통

담당부서 (아는 범위에서 선택)

잘모르겠음

현장 사진 (자동 압축 저장)

사진 추가 (여러 장 가능)

GRS 보수ON

점포

대시보드

접수 목록

채팅 2

+ 신규 접수

개선

점포 모드 — 보수공사 접수 및 진행상황 열람

보수공사

고장·누수·파손 등 일반 보수

오픈 직후 추가요청

오픈 후 공사 보완·변경 요청

오픈 공사를 맡았던 인테리어 시공사 정보를 함께 남겨면 하자 책임 구분과 A/S 요청이 빨라집니다.

오픈일

08/17/2026

오픈 후 6일 경과 — 오픈 하자·보완 대상 기간(30일 이내)입니다.

요청 구분

공사 보완

오픈 시공사 (인테리어)

모르겠음 / 해당없음

점포명 (입력하면 전국 점포 목록에서 검색됩니다)

롯데리아 강남역점

요청 제목

예) 홀 조명 밝기 보완 및 스위치 위치 변경

요청 내용 (상세)

GRS 보수ON

점포

대시보드

접수 목록

채팅 2

+ 신규 접수

개선

목록으로

R-2608-A1B2

실속일정 등록 대기

긴급

주방 배수구 막힘 및 누수

롯데리아 강남역점

1 2 3 4 5 6

실속 일정 견적 등록 견적 검토 공사 일정 공사 진행 완료

현재 「실속 일정」 단계가 처리기한을 6일 초과했습니다. (시공업체 조치 필요)

1. 접수 내용

점포

롯데리아 강남역점

접수일

2026.08.15 01:00

긴급도

긴급

담당부서

인테리어팀

시공업체

토마토세븐

공사내용

주방 트랜치 배수 역류로 바닥 물고임 발생. 영업 지장 있음.

배수구 사진

인테리어 누수

2. 실속 일정 기한 6일 초과

실속 일정이 등록되지 않았습니다.

3. 견적서

① 보수공사 접수

② 오픈 직후 추가요청 탭

③ 진행상황 상세

1 신규 접수

「+ 신규 접수」 탭에서 보수공사 또는 오픈 직후 추가요청을 고릅니다.

2 내용 작성

제목·내용·긴급도를 적고 현장 사진을 여러 장 올립니다. 사진은 자동 압축되니 용량 신경 쓰지 않으셔도 됩니다.

3 오픈 직후 추가요청이라면

오픈일과 요청 구분(공사 보완/설계 변경/마감 하자/추가 설치), 오픈 공사를 맡았던 인테리어 시공사를 함께 남겨주세요. 하자 책임 구분과 A/S 요청이 빨라집니다.

4 접수하기

접수 즉시 담당 시공업체와 본사 화면에 실시간으로 뜹니다.

5 공사 일정 승인

시공업체가 일정을 제안하면 상세화면에서 승인 또는 조율 요청을 누릅니다.

6 완료 확인 서명

공사가 끝나면 결과를 확인하고 만족도 점수와 서명을 남깁니다.

작성 중이던 내용은 자동 저장됩니다

사진을 올리다 앱이 꺼져도 제목·내용이 남아 있어 이어서 작성할 수 있습니다.



보수 시공업체

토마토세븐 · 우리아이엔티

담당 점포의 접수 건만 표시됩니다. 실측 → 견적 → 일정 → 공사 → 완료 순서로 진행합니다.

① 접수 건 상세

② 견적서 업로드

③ 공사 완료 처리

1 실측 일정 등록

접수 건을 열어 실측일을 등록합니다. 실측이 필요 없으면 「실측 생략」으로 바로 견적 단계로 넘어갑니다.

2 실측 사진 업로드

현장 사진을 올려두면 본사 검토가 빨라집니다.

3 견적서 업로드

금액과 견적일을 넣고 견적서 파일을 첨부합니다. 「표준 견적서 양식」 버튼으로 받은 엑셀로 작성하면 항목·금액이 자동 검토됩니다.

4 공사 일정 제안

본사 승인이 나면 공사 일정을 제안합니다. 점포가 승인해야 확정됩니다.

5 작업 시작 / 종료

현장에서 버튼을 눌러 실제 작업 시각을 기록합니다.

6 공사 완료 처리

완료 사진을 첨부해 마무리하면 점포 확인 서명 단계로 넘어갑니다.



본사담당 — 보수공사

보수/인테리어 담당자

전체 현황을 보고 견적을 검토·승인합니다. 처리기한을 넘긴 건은 자동으로 표시됩니다.

GRS 보수ON

본사담당

보수공사 조명·타일 발주

대시보드 접수 목록 채팅 개선요청 설정

본사담당 모드 — 견적 검토·승인, 설정, 전체 현황 관리

8 전체 접수, 7 진행중, 3 기한 초과, 1 완료, 2 뒤편 직후

단계별 현황

단계	진행률	개수
실측 일정	100%	2
견적 등록	100%	2
견적 검토	50%	1
공사 일정	100%	1
공사 진행	100%	1
완료	100%	1
종단	0%	0

파트너사 평가 현황

완료 실적 1건 · 평균 처리 26일

점포 만족도 평가 없음

① 대시보드

GRS 보수ON

본사담당

보수공사 조명·타일 발주

대시보드 접수 목록 채팅 개선요청 설정

본사검토 대기

R-2607-C3D4

매장 출입문 자동문 고장

롯데리아 홍대점

실측 일정 견적 등록 견적 검토 공사 일정 공사 진행 완료

현재 「견적 검토」 단계가 처리기한을 2일 초과했습니다. (본사담당 조치 필요)

1. 접수 내용

점포 롯데리아 홍대점

접수일 2026.08.18 01:00

긴급도 보통

견적 검토

R-2607-C3D4 · 검토의견은 관계자 전체에게 공개됩니다

검토 결과

승인 — 공사일정 등록 진행

검토 의견

예) 금액 적정, 승인합니다 / 자재 단가 내역 첨부 요망

검토 완료

② 견적 검토

GRS 보수ON

본사담당

보수공사 조명·타일 발주

대시보드 접수 목록 채팅 개선요청 설정

본사담당 모드 — 견적 검토·승인, 설정, 전체 현황 관리

서버 연결 진단

사진·견적서가 안 보이거나 저장이 안 될 때 눌러주세요. 실제 저장·조회를 시험해 원인을 알려드립니다.

진단 실행

단계별 처리기한 (SLA)

각 단계 진입 후 아래 일수를 초과하면 기한초과 알림이 표시됩니다.

단계	처리기한
실측 일정 (시공업체)	3 일 이내
견적 등록 (시공업체)	3 일 이내
견적 검토 (본사담당)	2 일 이내
공사 일정 (시공업체)	7 일 이내
공사 진행 (시공업체)	14 일 이내

소속별 접속코드

③ 설정

1 현황 확인

대시보드에서 진행중·기한초과·오픈 직후 건수를 한눈에 봅니다. 숫자를 누르면 해당 목록으로 이동합니다.

2 견적 검토

견적이 올라온 건을 열어 승인 또는 보완요청을 선택합니다. 엑셀 견적서는 자동 검토 리포트가 함께 표시됩니다.

3 첨부파일 확인·내려받기

상세화면 아래 「첨부파일」에서 사진·견적서를 열거나 내려받습니다.

4 설정 관리

접속코드, 단계별 처리기한, 점포 목록, 인테리어 시공사와 전용 접속코드를 관리합니다.

5 현황 내보내기

접수 목록에서 「엑셀(CSV) 내보내기」로 전체 현황을 받습니다.



조명·타일 공급사

에이플러스(조명) · 우석타일(타일)

본사가 도면을 올리면 수량을 산출해 견적서를 제출하고, 납품 후 정산·청구를 관리합니다.

GRS 보수ON

조명 공급사

대시보드

발주 목록

채팅 2

정산·청구

개선도

목록으로

O-2608-L001

공급사 수량산출·견적 대기

직영점

롯데리아 수원역점 · 조명 발주

에이플러스 → 인터피아

1 2 3 4 5 6

도면 견적 확정 납품일 납품 정산

1. 발주 정보 · 도면

기한 D-3

현장 롯데리아 수원역점

구분 직영점 조명

공급사 에이플러스

시공사 인터피아

GRS 담당 김본사

오픈 예정 2026.09.11

도면 3매 제공됨

확정 권한 GRS 공사담당 (직영점 프로세스)

정산 방식 월단위 정산

제공 도면

수량역점_조명배치도.pdf

1KB · 2026.08.22 01:00

열기

다운로드

수량역점_천장평면도.pdf

1KB · 2026.08.22 01:00

열기

다운로드

2. 수량산출·견적서

에이플러스의 수량산출·견적서 제출 대기중입니다.

① 발주 건과 도면 확인

GRS 보수ON

조명 공급사

대시보드

발주 목록

채팅 2

정산·청구

개선도

목록으로

표준 품목 선택

조명 · 69종 · 단가는 부가세 별도

코드·품명·규격 검색

전체 공통 롯데리아 엔제리너스

크리스피크림도넛 스탬브루

SMPS 공통

이파워

300W · 외경 W168*H54*H36

44,000원

/SET

SMPS합 공통

철제 안정기함

외경 W250*D100*H50

3,000원

/EA

레이 공통

2P 레일

외경 L3000*W33*H17

3,000원

/M

레이부속 공통

2P 레일 부속

1,400원

/EA

LO-LT-01 공통

3" 매입등

4,000K · 15W · 외경 ø89*H135 · 타공 ø75

21,500원

/SET

LO-LT-02 공통

3" 매입등, 확산형

4,000K · 15W · 외경 ø89*H135 · 타공 ø75

22,500원

/SET

LO-LT-03 공통

슬림평판LED (달파, T BAR)

20,000원

/SET

달기

② 표준 품목 선택

GRS 보수ON

조명 공급사

대시보드

발주 목록

채팅 2

정산·청구

개선도

수량산출·견적서 제출

O-2608-L001 · 롯데리아 수원역점 · 조명 · 에이플러스

표준 품목표(2026.08.20 (코드체계 2026.08.24 정정))에서 코드를
고르면 사진·규격·단가가 자동으로 채워집니다.

표준 견적서 양식(.xlsx) 내려받기

견적서 파일 (엑셀 업로드 시 자동 인식 · PDF/사진 가능)

파일 선택

견적일

08/24/2026

납품 가능일

mm/dd/yyyy

수량산출 내역

RIA-LT-01 롯데리아

3" 매입등

4,000K · 15W · 외경 ø89*H135 · 타공 ø75

삭제

SET

48

21500

+ 표준 품목 선택

+ 직접 입력

운반비 (납품 지역)

운반비 없음 / 별도 협의

RIA-LT-01 추가됨

③ 견적 작성

1 발주 확인

발주 목록에서 「공급사 수량산출·견적 대기」 건을 열고 첨부된 도면을 내려받습니다.

2 견적서 작성

「수량산출·견적서 제출」을 누릅니다. 「+ 표준 품목 선택」에서 코드(예: RIA-LT-01)를 고르면 사진·색온도·외경·타공사이즈·단가가 자동으로 채워집니다. 수량만 입력하면 됩니다.

3 목록에 없는 품목

「+ 직접 입력」으로 품명·규격·단가를 직접 적습니다.

4 운반비

납품 지역을 고르면 지역별 운임료가 자동 합산됩니다. (조명은 최초 1회만 정산)

5 엑셀로 올리기

표준 견적서 양식(.xlsx)으로 작성해 올리면 품목이 자동 인식되고, 표준 품목과 코드가 맞으면 사진까지 연결됩니다.



대시보드

발주 목록



채팅 2

정산·청구

개선요

에이프러스 모드 — 도면 확인, 수량산출·견적서 제출 (조명)



청구 요약

에이프러스

납품확인서 서명이 완료된 건만 청구 대상입니다. 직영점분은 롯데GRS 본사에 월단위로, 가맹점분은 시공사별로 개별 청구합니다.

④ 정산·청구 화면

6 정산·청구

「정산·청구」 탭에서 청구처별로 확인합니다. 직영점분은 롯데GRS 본사에 월단위로, 가맹점분은 시공사별로 개별 청구합니다. 청구처별 거래명세서를 PDF로 뽑을 수 있습니다.

가맹점 견적을 확정하고, 납품일을 협의하고, 물품 수령 시 납품확인서에 서명합니다.

GRS 보수ON

인테리어 시공사

대시보드

발주 목록

채팅 2

개선요청

목록으로

O-2607-T002

납품 대기

직영점

엔제리너스 광고점 · 타일 발주

우석타일 → 하빈아이엔티

도면

견적

확정

4

5

6

1. 발주 정보 · 도면

현장

엔제리너스 광고점

구분

직영점

타일

공급사

우석타일

시공사

하빈아이엔티

GRS 담당

김본사

오픈 예정

2026.08.21

도면

4매 제공됨

확정 권한

GRS 공사담당 (직영점 프로세스)

정산 방식

월단위 정산

제공 도면

광고점_타일_시공도.pdf

1KB · 2026.07.31 01:00

열기

다운로드

2. 수량산출·견적서

견적금액

3,372,000원

견적일

2026.08.06

첨부

광고점_타일_수량산출서.xlsx

GRS 보수ON

인테리어 시공사

대시보드

발주 목록

채팅 2

개선요청

물품납품확인서

O-2607-T002 · 엔제리너스 광고점 · 우석타일 납품분

아래 품목을 수령하셨음을 확인하고 서명해주세요. 서명 즉시 정산 대상이 됩니다.

품목	규격	단위	수량	단가	금액
포세린 타일	800×800 풀리싱	m ²	64	47,000	3,008,000
계단 노출블	1200mm	EA	14	26,000	364,000
합계 (2개 품목)					3,372,000

수령일시

08/24/2026, 01:01 AM

납품 사진 (견장 — 수령 물품·수량 확인용)

납품 사진 추가 (여러 장 가능)

검수 결과

전 품목 이상 없이 수령

비고

특이사항이 있으면 적어주세요

수령자 서명

GRS 보수ON

인테리어 시공사

대시보드

발주 목록

채팅 2

개선요청

하빈아이엔티 모드 — 가맹점 견적 확정, 납품일 협의, 물품 수령·납품확인서 서명

발주 진행 현황

0

견적 대기 >

0

확정 대기 >

0

납품일 협의 >

1

납품 대기 >

0

정산 대기 >

1

전체 >

정산 현황

정산 대기

0원 0건

2026년 8월 완료

0원

직영점 대기

0건 · 0원

가맹점 대기

0건 · 0원

최근 발주

O-2607-T002

납품 대기

직영점

타일

엔제리너스 광고점

우석타일 → 하빈아이엔티 · 3,372,000원

① 발주 건 상세

② 물품납품확인서

③ 대시보드

1 견적 확정 (가맹점)

가맹점 견은 현장소장이 직접 확정합니다. 금액을 조정하거나 보완요청할 수 있습니다. (직영점은 본사가 확정합니다)

2 납품일 협의

공급사와 협의한 납품 예정일·장소·요청사항을 등록합니다.

3 물품 수령

물건을 받으면 「👉 물품 수령 · 납품확인서 작성」을 누릅니다.

4 납품 사진 촬영

받은 물품과 수량이 보이도록 사진을 여러 장 올립니다. 불량·부족이 있으면 그 부위가 보이게 찍어주세요.

5 검수 결과와 서명

이상 유무를 고르고 손가락으로 서명합니다. 서명하면 정산 대상이 됩니다.

6 확인서 출력

저장 후 「물품납품확인서 출력」으로 A4 PDF를 받을 수 있습니다. 품목표·검수결과·납품사진·서명이 모두 들어갑니다.

서명 후에도 사진을 추가할 수 있습니다

정산 전이라면 상세화면에서 납품 사진을 더 올릴 수 있습니다.



본사담당 — 조명·타일 발주

공사담당자

헤더 아래 「조명·타일 발주」로 전환합니다. 발주 등록부터 정산까지 관리합니다.

GRS 보수ON 본사담당

보수공사 조명·타일 발주

대시보드 발주 목록 + 발주 등록 채팅 2 정산

본사담당 모드 — 발주 등록, 도면 제공, 직영점 견적 확정, 정산 관리

조명·타일 발주 등록

GRS가 도면을 제공하면 공급사가 수량을 산출해 견적서를 제출합니다.

현장(점포)명

점포명 검색 또는 직접 입력

운영 구분

직영점

직영점 — 견적 확정은 GRS 공사담당자, 정산은 월단위입니다.

발주 품목

조명

공급사: 에이프러스

인테리어 시공사

인터피아

오픈 예정일

09/07/2026

① 발주 등록

GRS 보수ON 본사담당

보수공사 조명·타일 발주

대시보드 발주 목록 + 발주 등록 채팅 2 정산

목록으로

O-2607-L003 정산 대기 직영점

크리스피크림 판교점 · 조명 발주

에이프러스 → 대경아이디

도면 견적 확정 납품일 납품 정산

1. 발주 정보 · 도면

현장 크리스피크림 판교점

구분 직영점 조명

공급사 에이프러스

시공사 대경아이디

GRS 담당 김본사

오픈 예정 2026.08.18

도면 3매 제공됨

확정 권한 GRS 공사담당 (직영점 프로세스)

정산 방식 월단위 정산

제공 도면

판교점_조명도.pdf

1KB · 2026.07.24 01:00

열기 다운로드

2. 수량산출·견적서

견적금액 3,058,000원

② 발주 상세

GRS 보수ON 본사담당

보수공사 조명·타일 발주

대시보드 발주 목록 + 발주 등록 채팅 2 정산

본사담당 모드 — 발주 등록, 도면 제공, 직영점 견적 확정, 정산 관리

정산 관리

정산 귀속월

2026-08

공급사	정산대기	대기금액	2026년 8월 완료	완료금액
에이프러스	2건	5,223,800	0건	0
우석타일	0건	0	0건	0
합계	2건	5,223,800	0건	0

정산 내역 CSV 내려받기

직영점 — 월단위 정산 대기 2건

납품확인서 서명이 완료된 건입니다. 월단위로 묶어 정산합니다. 합계 5,223,800원

조명 직영점

크리스피크림 판교점 · 에이프러스

청구처: 롯데GRS 본사 (본사 일괄 청구 (월단위))

O-2607-L003 · 수령 2026.08.15 · 3,058,000원

조명 직영점 납품 이상

③ 정산 관리

1 발주 등록

현장명, 직영점/가맹점, 조명/타일, 시공사, 오픈 예정일을 넣고 도면을 첨부하면 공급사에 견적이 요청됩니다.

2 견적 확정 (직영점)

직영점 견은 본사가 확정합니다. 금액 조정과 보완요청이 가능합니다.

3 진행 확인

납품일 협의 → 납품·확인서 단계가 실시간으로 갱신됩니다. 납품 이상이 기재된 건은 대시보드 「 납품 이상 보고」에 모입니다.

4 정산

정산 탭에서 직영점(월단위)·가맹점(개별)을 나눠 봅니다. 공급사별 집계와 CSV 내려받기를 제공합니다.

5 발주 정보 수정·중단

상세화면 아래에서 발주 정보를 수정하거나 중단 처리할 수 있습니다. 중단해도 기록은 남고 되돌릴 수 있습니다.

6 시공사 접속코드 발급


설정 → 인테리어 시공사에서 업체별 전용 코드를 발급하고 안내 문구를 복사해 전달합니다.



함께 쓰는 기능

모든 사용자


두 시스템에서 공통으로 쓰는 기능입니다.

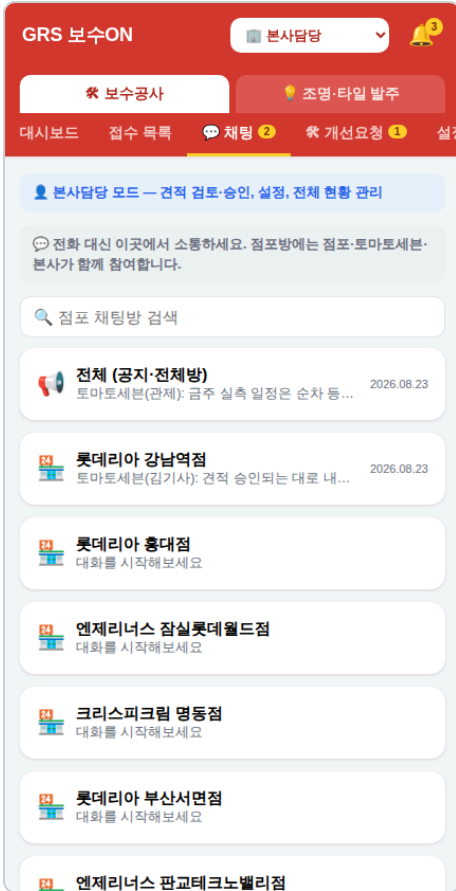

① 채팅



② 개선요청 게시판

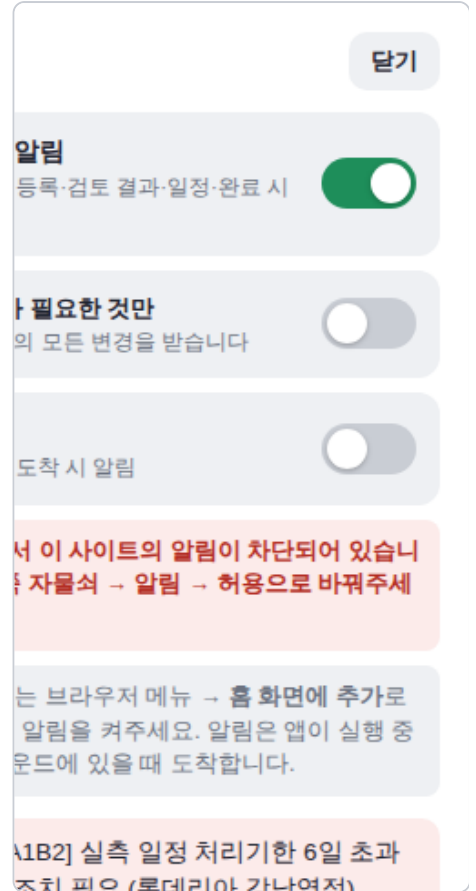

③ 알림 설정

1 채팅

전화 대신 이곳에서 소통합니다. 점포방에는 점포·시공업체·본사가 함께 참여합니다.

2 오류 신고·개선 제안

「**개선요청**」 탭에서 누구나 글을 남길 수 있습니다. 화면 캡처를 첨부하면 확인이 빨라지고, 본사가 답변과 처리 상태를 남깁니다.

3 알림

 → 진행상황 알림 / 채팅 알림을 켭니다. 「**내 조치가 필요한 것만**」을 켜면 내 차례일 때만 올립니다.

알림은 앱이 켜져 있거나 백그라운드에 있을 때 도착합니다. 앱을 완전히 종료하면 알림이 오지 않습니다. 휴대폰은 「**홈 화면에 추가**」로 설치한 뒤 사용해주세요.



문제가 생기면

모든 사용자

자주 나오는 상황과 해결 방법입니다.

증상	확인할 것
사진이 「불러오는 중」에서 멈춤	화면의 「 다시 불러오기」를 눌러보세요. 계속되면 본사에 알려주세요 (설정 → 서버 연결 진단으로 원인 확인)
큰 엑셀·PDF가 첨부되지 않음	1건당 약 880KB가 한계입니다. 견적서는 사진으로 촬영하거나 파일 용량을 줄여주세요. 금액·품목은 정상 저장됩니다
알림이 오지 않음	홈 화면에 추가했는지, 에서 알림이 켜져 있는지, 브라우저에서 이 사이트 알림이 차단되지 않았는지 확인
접속코드가 틀렸다고 나옴	소속을 올바르게 골랐는지 확인하세요. 인테리어 시공사는 업체별 전용 코드가 따로 있을 수 있습니다
화면이 예전 상태로 보임	앱을 완전히 종료했다 다시 켜면 최신 버전으로 갱신됩니다



본사담당 → 설정 → 서버 연결 진단

그 밖의 문제는 「 개선요청」 탭에 남겨주세요. 화면 캡처를 함께 올려주시면 훨씬 빠르게 확인할 수 있습니다.
